



Direktoratet for  
e-helse

# Styringsgruppemøte for Akson

Møte 4/20  
1. juli 2020

Direktoratet for e-helse

Sak	Agenda Styringsgruppemøte for Akson	Tid	Sakstype
17/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden	09.00	Godkjenning
18/20	Status for arbeidet med Akson	09.05	Orientering
19/20	Eventuelt	10.25	
	Møtet ferdig	10.30	



Direktoratet for  
e-helse

**Sak 17/20**

**Godkjenning av innkalling og dagsorden**

# Forslag til vedtak

Styringsgruppen godkjenner innkalling og dagsorden.



Direktoratet for  
e-helse

## Sak 18/20: Status for arbeidet med Akson

# Status for arbeidet

**1** Ekstern kvalitetssikring (KS2)

**2** Intensjonserklæringer

**3** Forberedelser til etablering av selskapet Akson journal

**4** Veikart for e-helse

**5** Øvrige aktiviteter

# Hovedanbefalinger gitt i KS2

## Kommunal journalløsning

En nasjonal tjenesteleverandør, der staten anskaffer og drifter journalløsningen, og alle kommuner, fastleger og andre avtaleparter blir pålagt å ta i bruk løsningen.

**Sekundært: videreføre prosjektet med kommunal tjenesteleverandør og krav om minimum 85 % forpliktende deltakelse fra kommuner og fastleger før kunngjøring av anskaffelse.**

For begge alternativene gjelder følgende anbefalinger:

- SSD bør oppdateres slik at overordnede prinsipper om økosystem, plattformtilnærming og samhandling, samt en stegvis gjennomføring, er omsatt til en planlagt, konkret og troverdig løsnings- og gjennomføringsstrategi.
- Ny ekstern kvalitetssikring bør gjennomføres etter at prosjektet har oppdatert SSD.
- Tiltaket gis finansiering for 2021, men finansieringsbeslutning for resten av tiltaket bør utsettes til etter ny kvalitetssikring.
- Prinsippet om at det er kommunenes ansvar å innføre journalløsningen og å sikre gevinstene, skal videreføres.

## Helhetlig samhandling

**Gi finansiering for gjennomføring av prosjektene Grunndata- og tillitstjenester og NILAR i steg 1 i utviklingsretningen for samhandling med Direktoratet for e-helse som ansvarlig**

**Starte gjennomføring av Forprosjekt steg 2 høsten 2020 i samarbeid med Områdestyret for samhandling**

**Avvente med å etablere programstruktur for samhandling til etter at KS2 av sentralt styringsdokument for steg 2 foreligger**

**Dersom Akson journal videreføres som planlagt underlagt kommunalt styre, anbefaler vi at fremtidig gjennomføring skjer i form av to programmer, men hvor steg 1 har et redefinert innhold i tråd med vår anbefaling.**

# Status for arbeidet

**1** Ekstern kvalitetssikring (KS2)

**2** Intensjonserklæringer


**3** Forberedelser til etablering av selskapet Akson journal

**4** Veikart for e-helse

**5** Øvrige aktiviteter



# 56 prosent av kommunene (i innbyggertall) har pt. signert intensjonserklæringen

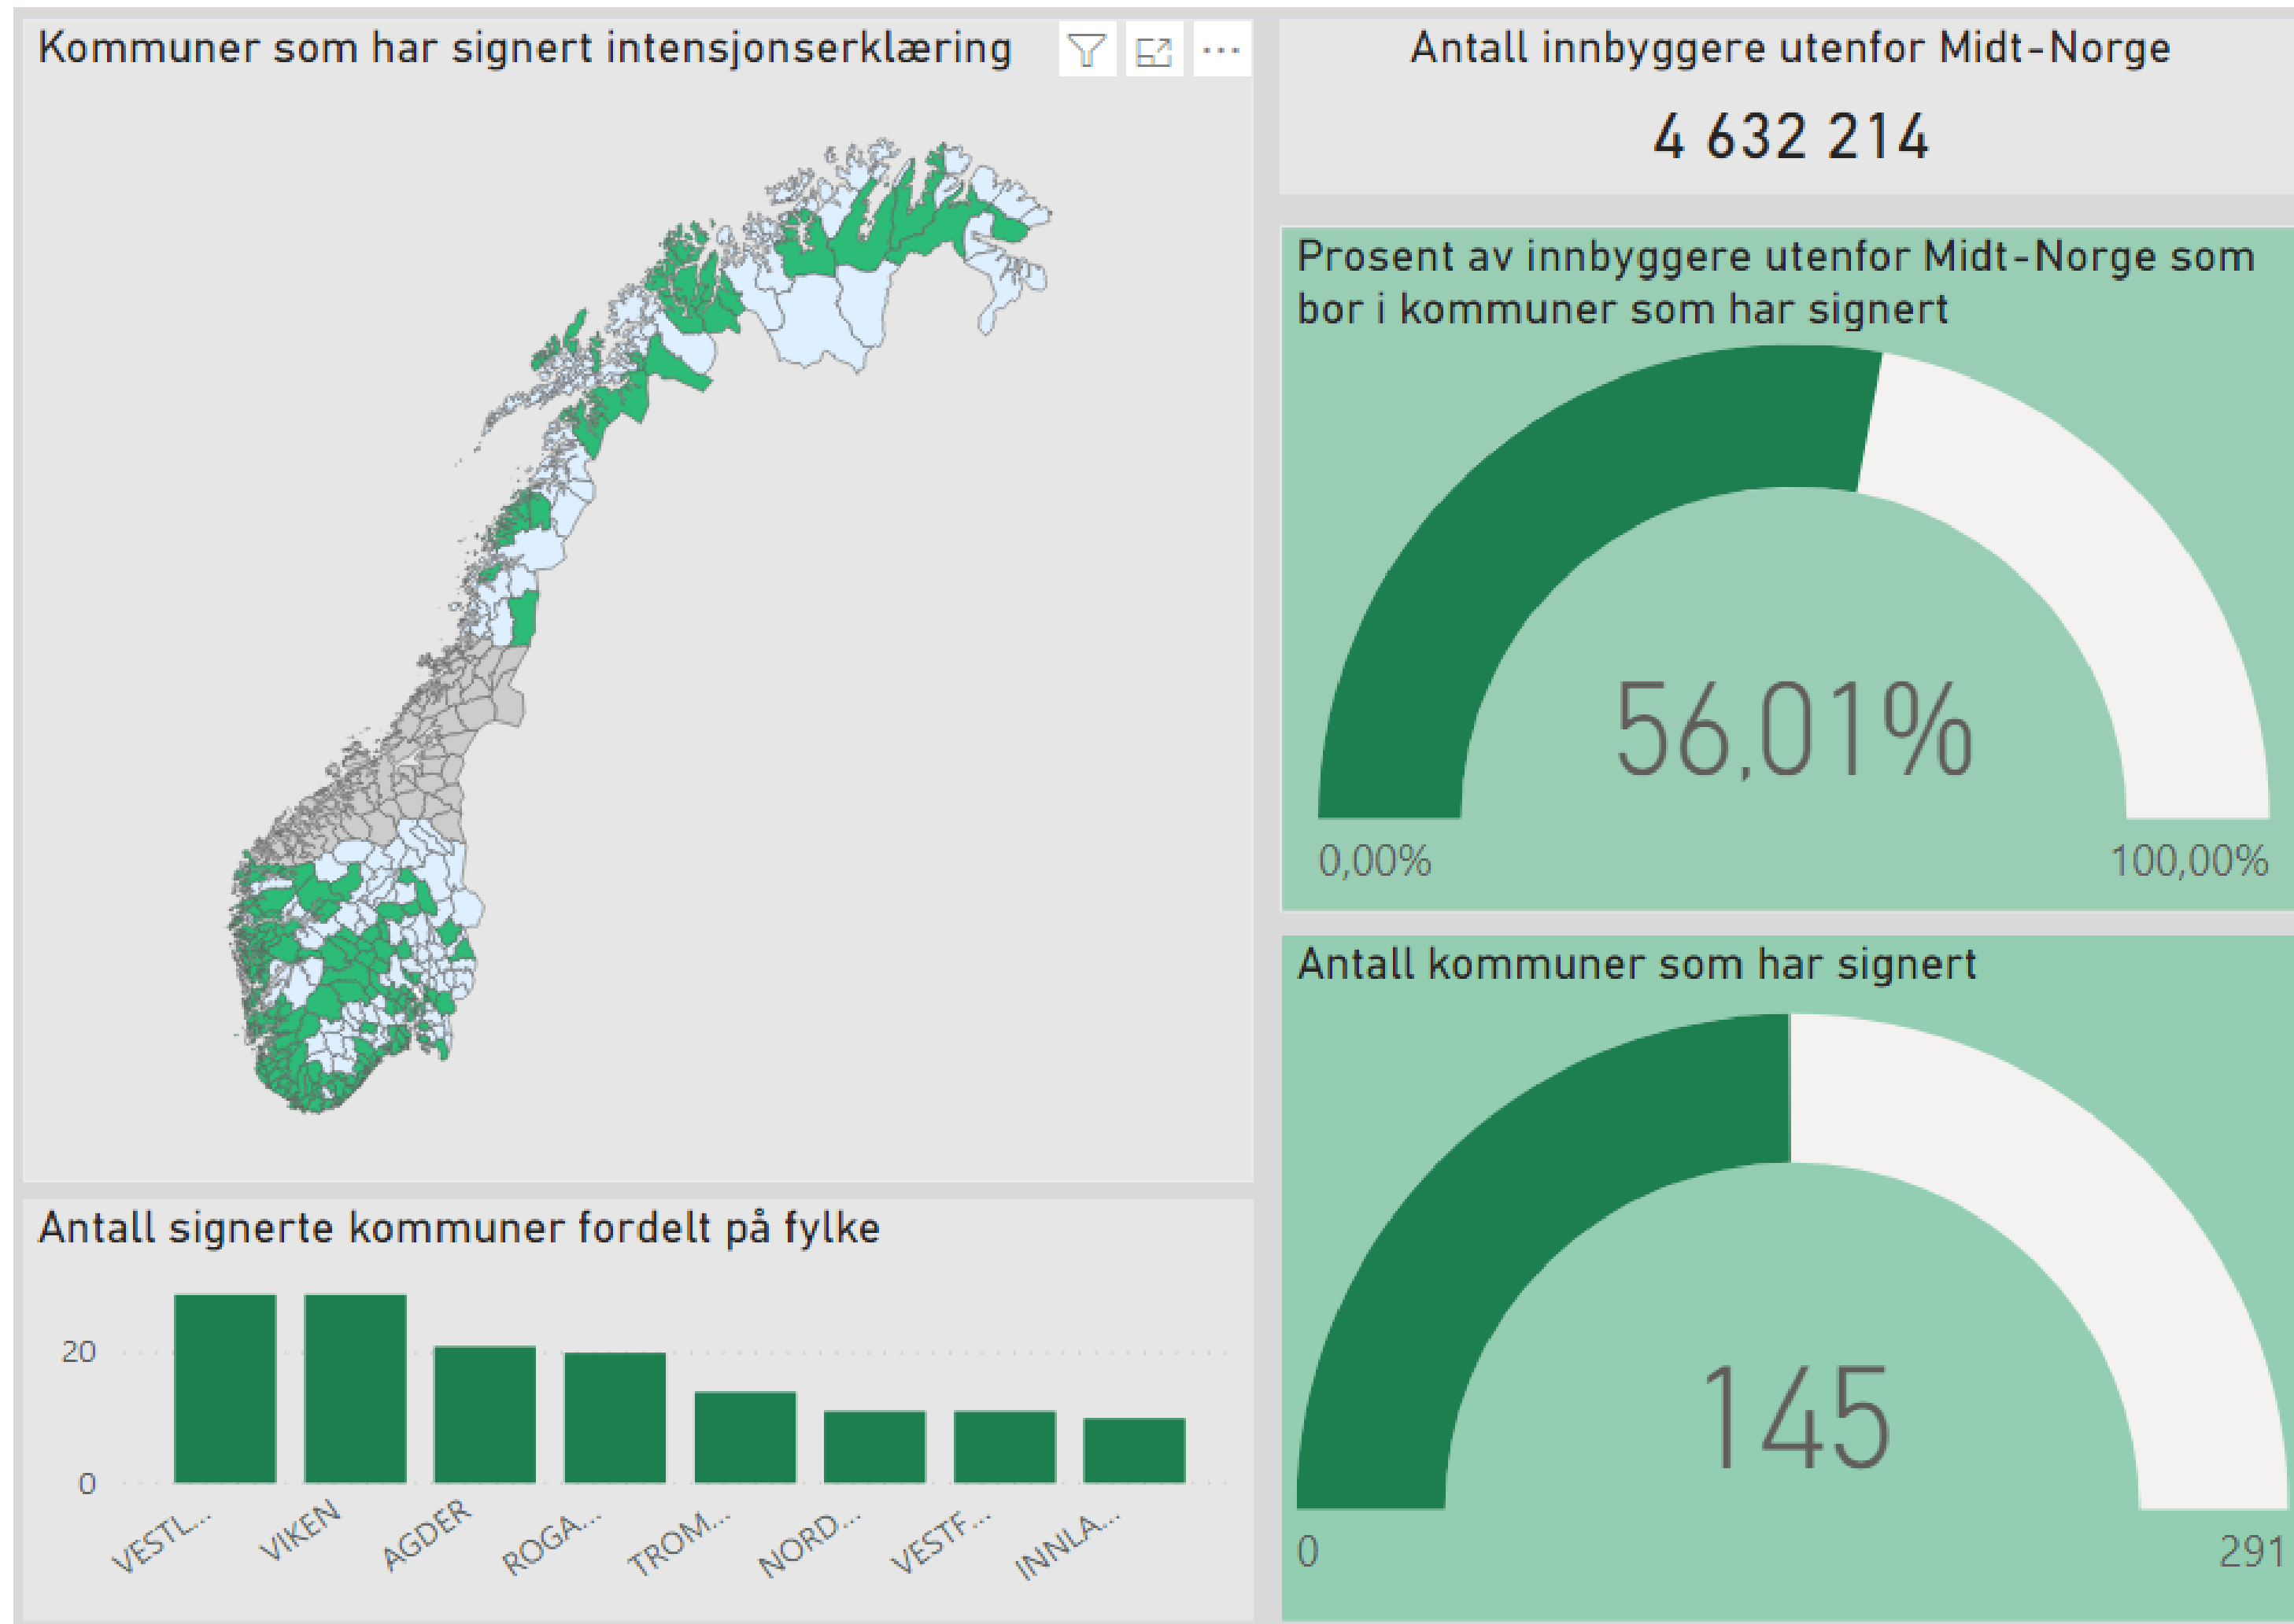

Noen kommuner har fått utsatt frist til 7. juli

Se oppdatert oversikt på [ks.no/akson](https://ks.no/akson)

# Status for arbeidet

**1** Ekstern kvalitetssikring (KS2)

**2** Intensjonserklæringer

**3** Forberedelser til etablering av selskapet av Akson journal

**4** Veikart for e-helse

**5** Øvrige aktiviteter

# Forberedelser til etablering av selskapet Akson journal

- Direktoratet for e-helse har fått et tilleggsoppdrag knyttet til forberedelse til selskapsetablering
- Helse- og omsorgsdepartementet har sammen med sju kommuner og KS etablert en felles styringsgruppe for forberedelsesarbeidet
- Direktoratet har etablert et felles prosjekt med kommunesektoren



Styringsgruppen skal levere et notat til Helse- og omsorgsdepartementet innen 3. juli 2020 som redegjør for status. Notatet skal omfatte:

- Styringsgruppens intensjon om å delta i det videre forberedelsesarbeidet, med formål om å etablere selskapet Akson journal i 2021, forutsatt nødvendige politiske vedtak.
- Avklare hvorvidt kommunesektoren ønsker staten på eiersiden av selskapet og aksept for statens minoritetspost.
- Styringsgruppens tilslutning til omfang, ansvar og tidsplan for gjenværende forberedelsesarbeid.
- Tidspunkt for selskapsetablering.
- Foreslå ulike tilknytningsformer til selskapet (f.eks. stegvis eierskap).
- Drøfte formål og overordnede eierspørsmål, spesielt med hensyn til stegvis tilnærming, inklusive alternative selskapsformer og eiermodeller.
- Foreløpig vurdering av risiko, kritiske forutsetninger og gjensidige avhengigheter for virksomheten, inklusive bemanning av virksomheten.

# Konklusjonspunkter fra styringsgruppen til HOD 3. juli

- Konklusjonspunktene danner utgangspunkt for det videre utredningsarbeidet og vil kunne justeres ut fra ny kunnskap og innsikt
- Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i samarbeid med kommunesektoren
- Forbehold om politiske vedtak for videre arbeid og føringer
- 17 delkonklusjoner fordelt på fire temaer:
  - Etablering av selskapet og eierskap ved staten og kommuner
  - Fordeling av kostnader
  - Videre forberedelsesarbeid høsten 2020
  - Etableringsprosjekt fra primo 2021 og politisk avklaring av eierskap

# Status på forberedelsesarbeidet til selskapsetablering

26.08.20

## Status på arbeidet med forberedelsene til etablering av selskapet Akson journal

### Bakgrunn

Det vises til pågående arbeid med prosjektet Akson – felles kommunal journalløsning og helhetlig samhandling. Direktoratet for e-helse leverte 29. februar 2020 sentralt styringsdokument til Helse- og omsorgsdepartementet, hvor det ble anbefalt at en ny virksomhet får ansvar for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og videreutvikle felles kommunal journalløsning (selskapet Akson journal). Trygghet knyttet til ansvars plasseringen og etableringen av denne virksomheten er en forutsetning for beslutning om gjennomføring av tiltaket og for den videre fremdriften i Akson.]

Det sentrale styringsdokumentet ble behandlet i styringsgruppen for Akson, som er Nasjonalt e-helsestyre, den 27. februar 2020. KS og kommunerepresentantene pekte på behov for videre arbeid for å besvare uavklarte spørsmål. Flere av spørsmålene er relatert til realiseringen av felles kommunal journalløsning og selskapet Akson journal, som adresseres i forberedelsesarbeidet til etableringen av selskapet Akson journal.

Helse- og omsorgsdepartementet etablerte i april 2020 en styringsgruppe med representanter fra kommunene Bergen, Bodø, Bærum, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Vinje, samt KS og Helse- og omsorgsdepartementet. Styringsgruppen er ansvarlig for nødvendige forberedelser til etablering av selskapet Akson journal. Direktoratet for e-helse, Trondheim kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar som observatører. I tillegg har Direktoratet for e-helse, KS og deltakende kommuner inngått i et prosjekt som har hatt ansvar for å følge opp oppgaver og føringer som har blitt gitt fra styringsgruppen. Prosjektet har utredet sentrale problemstillinger knyttet til rammebetingelsene for etablering av selskapet Akson journal og sammenheng med tiltaket som helhet.

I styringsgruppens mandat, som ble besluttet 29. april 2020, fremgår det at styringsgruppen skal levere et notat til Helse- og omsorgsdepartementet innen 3. juli 2020 som redegjør for status i forberedelsesarbeidet. Det vises til eget notat fra styringsgruppen til Helse- og omsorgsdepartementet som oppsummerer konklusjonspunktene fra arbeidet våren 2020. Nedenfor følger status i forberedelsesarbeidet som redegjør for problemstillingene som er drøftet i prosjektet våren 2020. Det skal arbeides videre med disse problemstillingene utover høsten 2020.

- En syntese av det pågående arbeidet i prosjektet våren 2020
- Drøftingene viser at det finnes relevante løsninger på sentrale spørsmål knyttet til selskapet Akson journal og realiseringen av felles kommunal journalløsning, og at man i det videre forberedelsesarbeidet vil konkretisere hvilke løsninger man bør anbefale
- Oppsummering av de innledende drøfteringer på spørsmål knyttet til:
  - Eierskap og tilknytningsformer til selskapet
  - Rammebetingelser for virksomheten
  - Kostnader, gevinster og risiko
- Det skal arbeides videre med disse problemstillingene utover høsten 2020

# Status for arbeidet

**1** Ekstern kvalitetssikring (KS2)


**2** Intensjonserklæringer

**3** Forberedelser til etablering av selskapet Akson journal

**4** Veikart for e-helse

**5** Øvrige aktiviteter

# Veikart for e-helse



Kilde: HOD: Konkretisering av oppdrag i tildelingsbrevet 2020, 29. april 2020

Direktoratet for e-helse skal innen **1. november** (utsatt frist fra 15. okt.) utarbeide et samlet veikart for e-helse:

- en samlet oversikt over planer for aktørenes innføring og bruk av nasjonale e-helseløsninger
- beskrivelse av sentrale avhengigheter, forutsetninger og konsekvenser for aktørene knyttet til innføring
- beskrive avhengigheter til planer for modernisering av journalsystemene i spesialisthelsetjenesten og ev. andre pågående prosjekter som kan ha nasjonal betydning


Direktoratet skal også innen **1. november** (utsatt frist fra 30. juni) konkretisere veikart for e-helse i kontekst av Akson. Veikartet beskriver utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

# Det har vært viktig med en tydeligere felles definisjon av når tjenester/funksjonalitet er klar for nasjonal innføring





# Aktørene inviteres til dialog om veikart og avhengigheter til de nasjonale e-helseløsningene

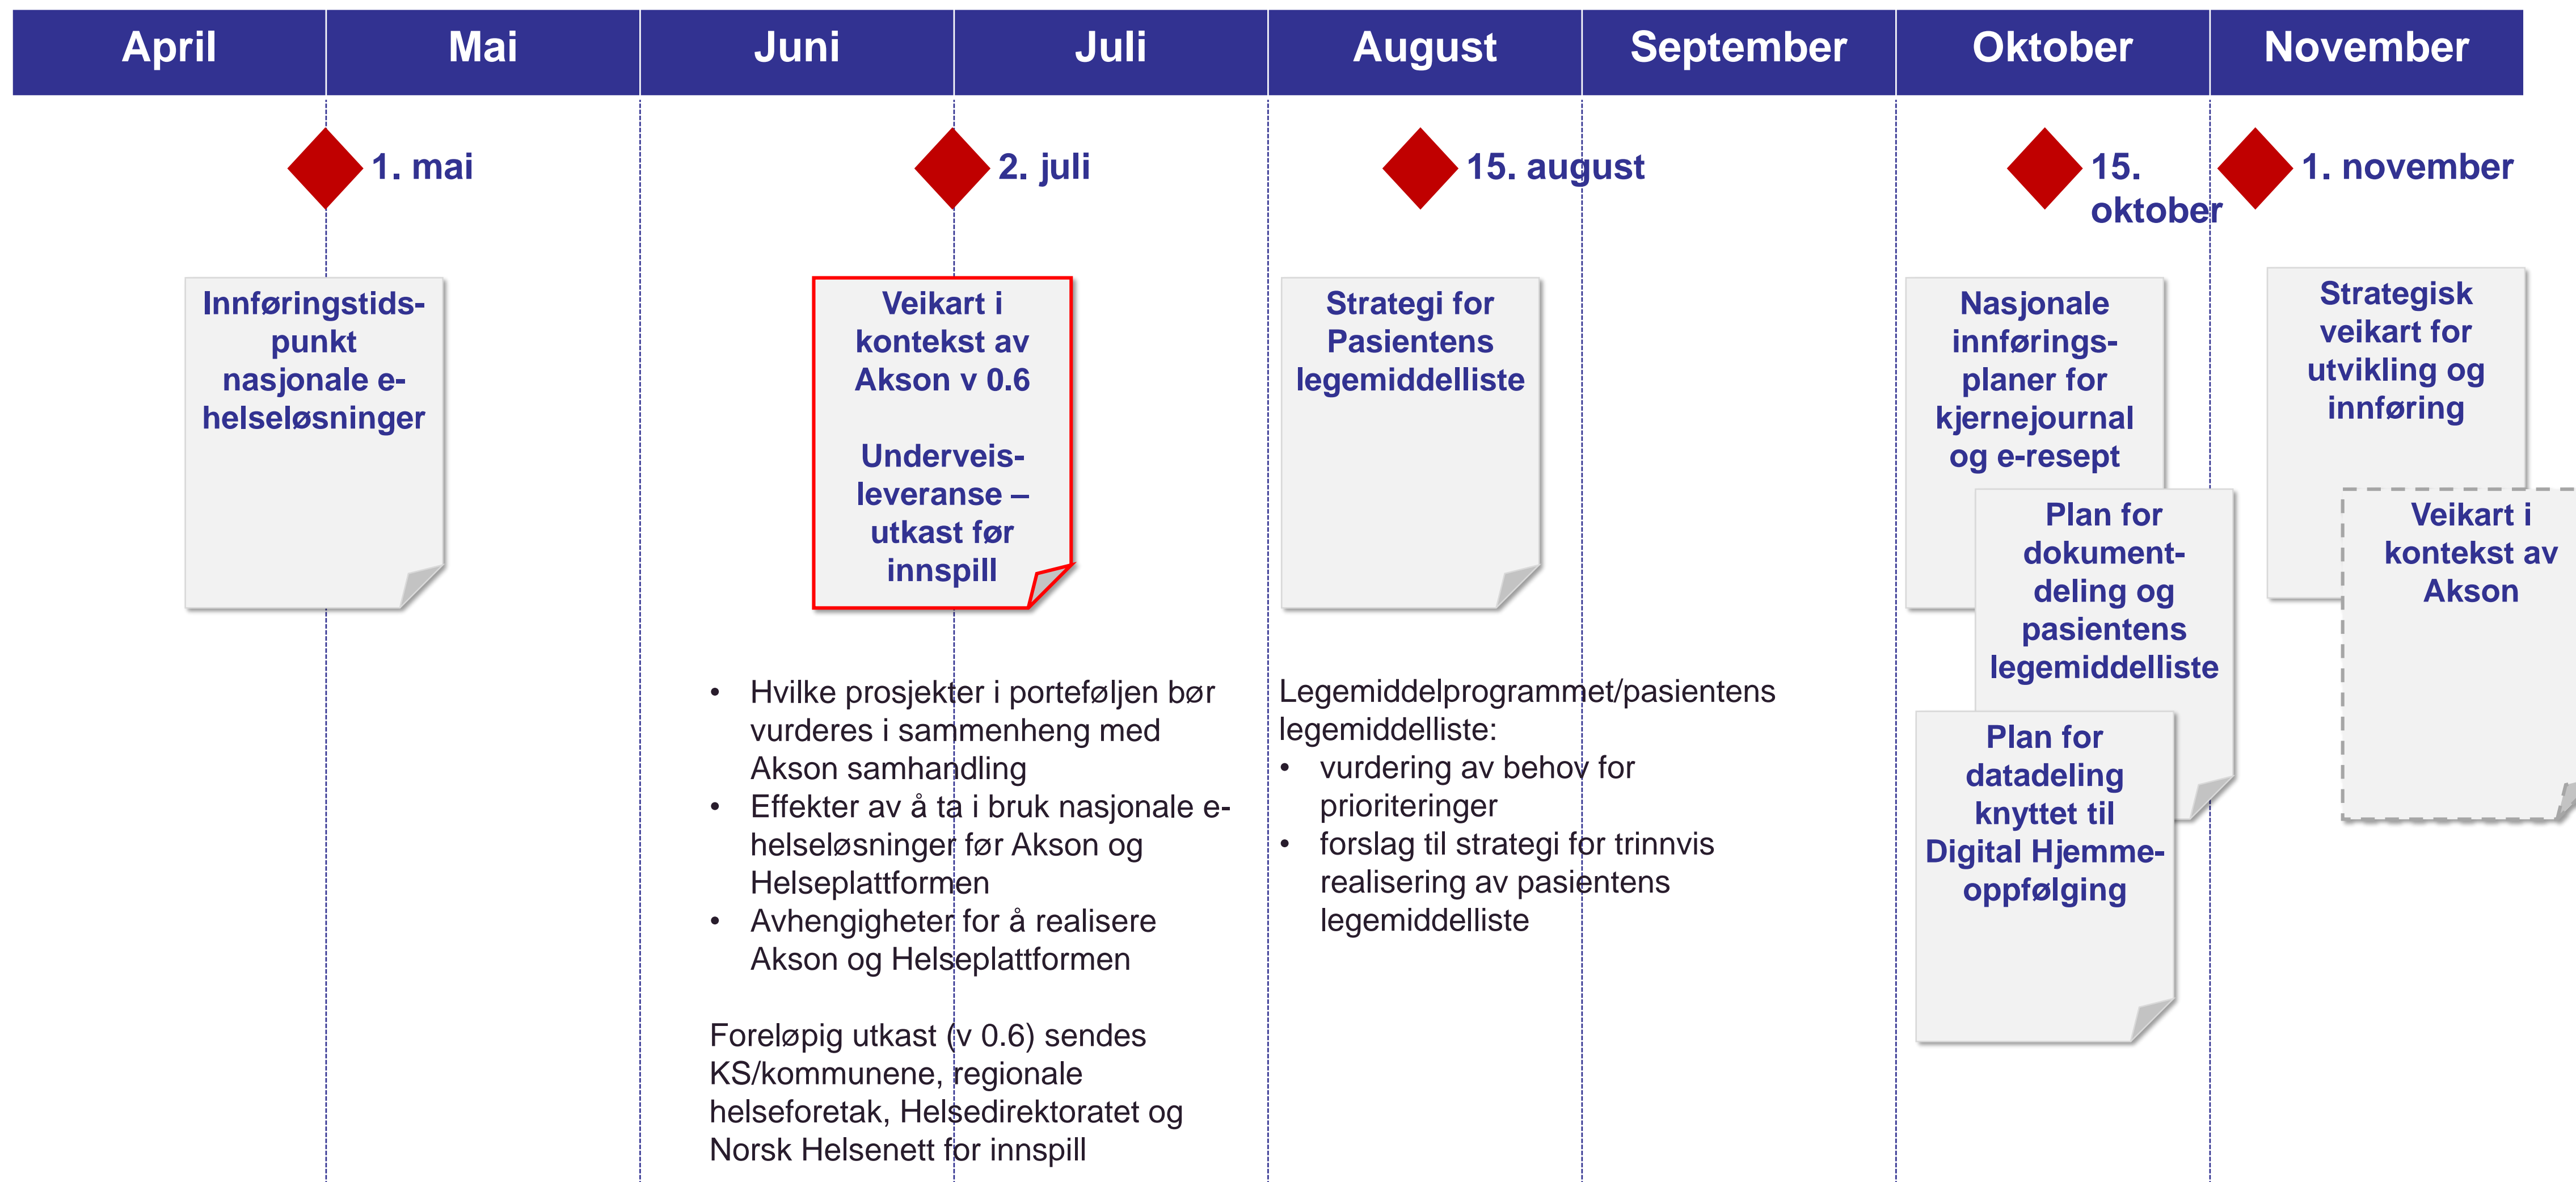

# Status for arbeidet

**1** Ekstern kvalitetssikring (KS2)

**2** Intensjonserklæringer

**3** Forberedelser til etablering av selskapet Akson journal

**4** Veikart for e-helse

**5** Øvrige aktiviteter

# Øvrige aktiviteter

## Lovarbeid

Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med rettsgrunnlag for Akson.

## ESA-notifikasjon

Det er initiert dialog med EFTA Surveillance Agency (ESA) med sikte på en prosess for å notifisere forvaltningsmodellen for felles kommunal journalløsning.

## Helse-plattformen

Forprosjektet Akson gjennomfører jevnlige møter for erfaringsutveksling med Helseplattformen.

## Leverandør-dialog

Prosjektet presenterte status i arbeidet i felles EPJ-leverandørmøte 10. juni.

Leverandørseminar 24. juni i regi av KS og Norway Health Tech, med bidrag fra direktoratet.

Løpende dialogmøter.

Styringsgruppen tar saken til orientering og ber prosjektet ta med seg innspill fremkommet i møtet.




Direktoratet for  
e-helse

Sak 19/20: Eventuelt

# Møteplan Nasjonalt e-helsestyre

17. september: Web-møte 2 timer

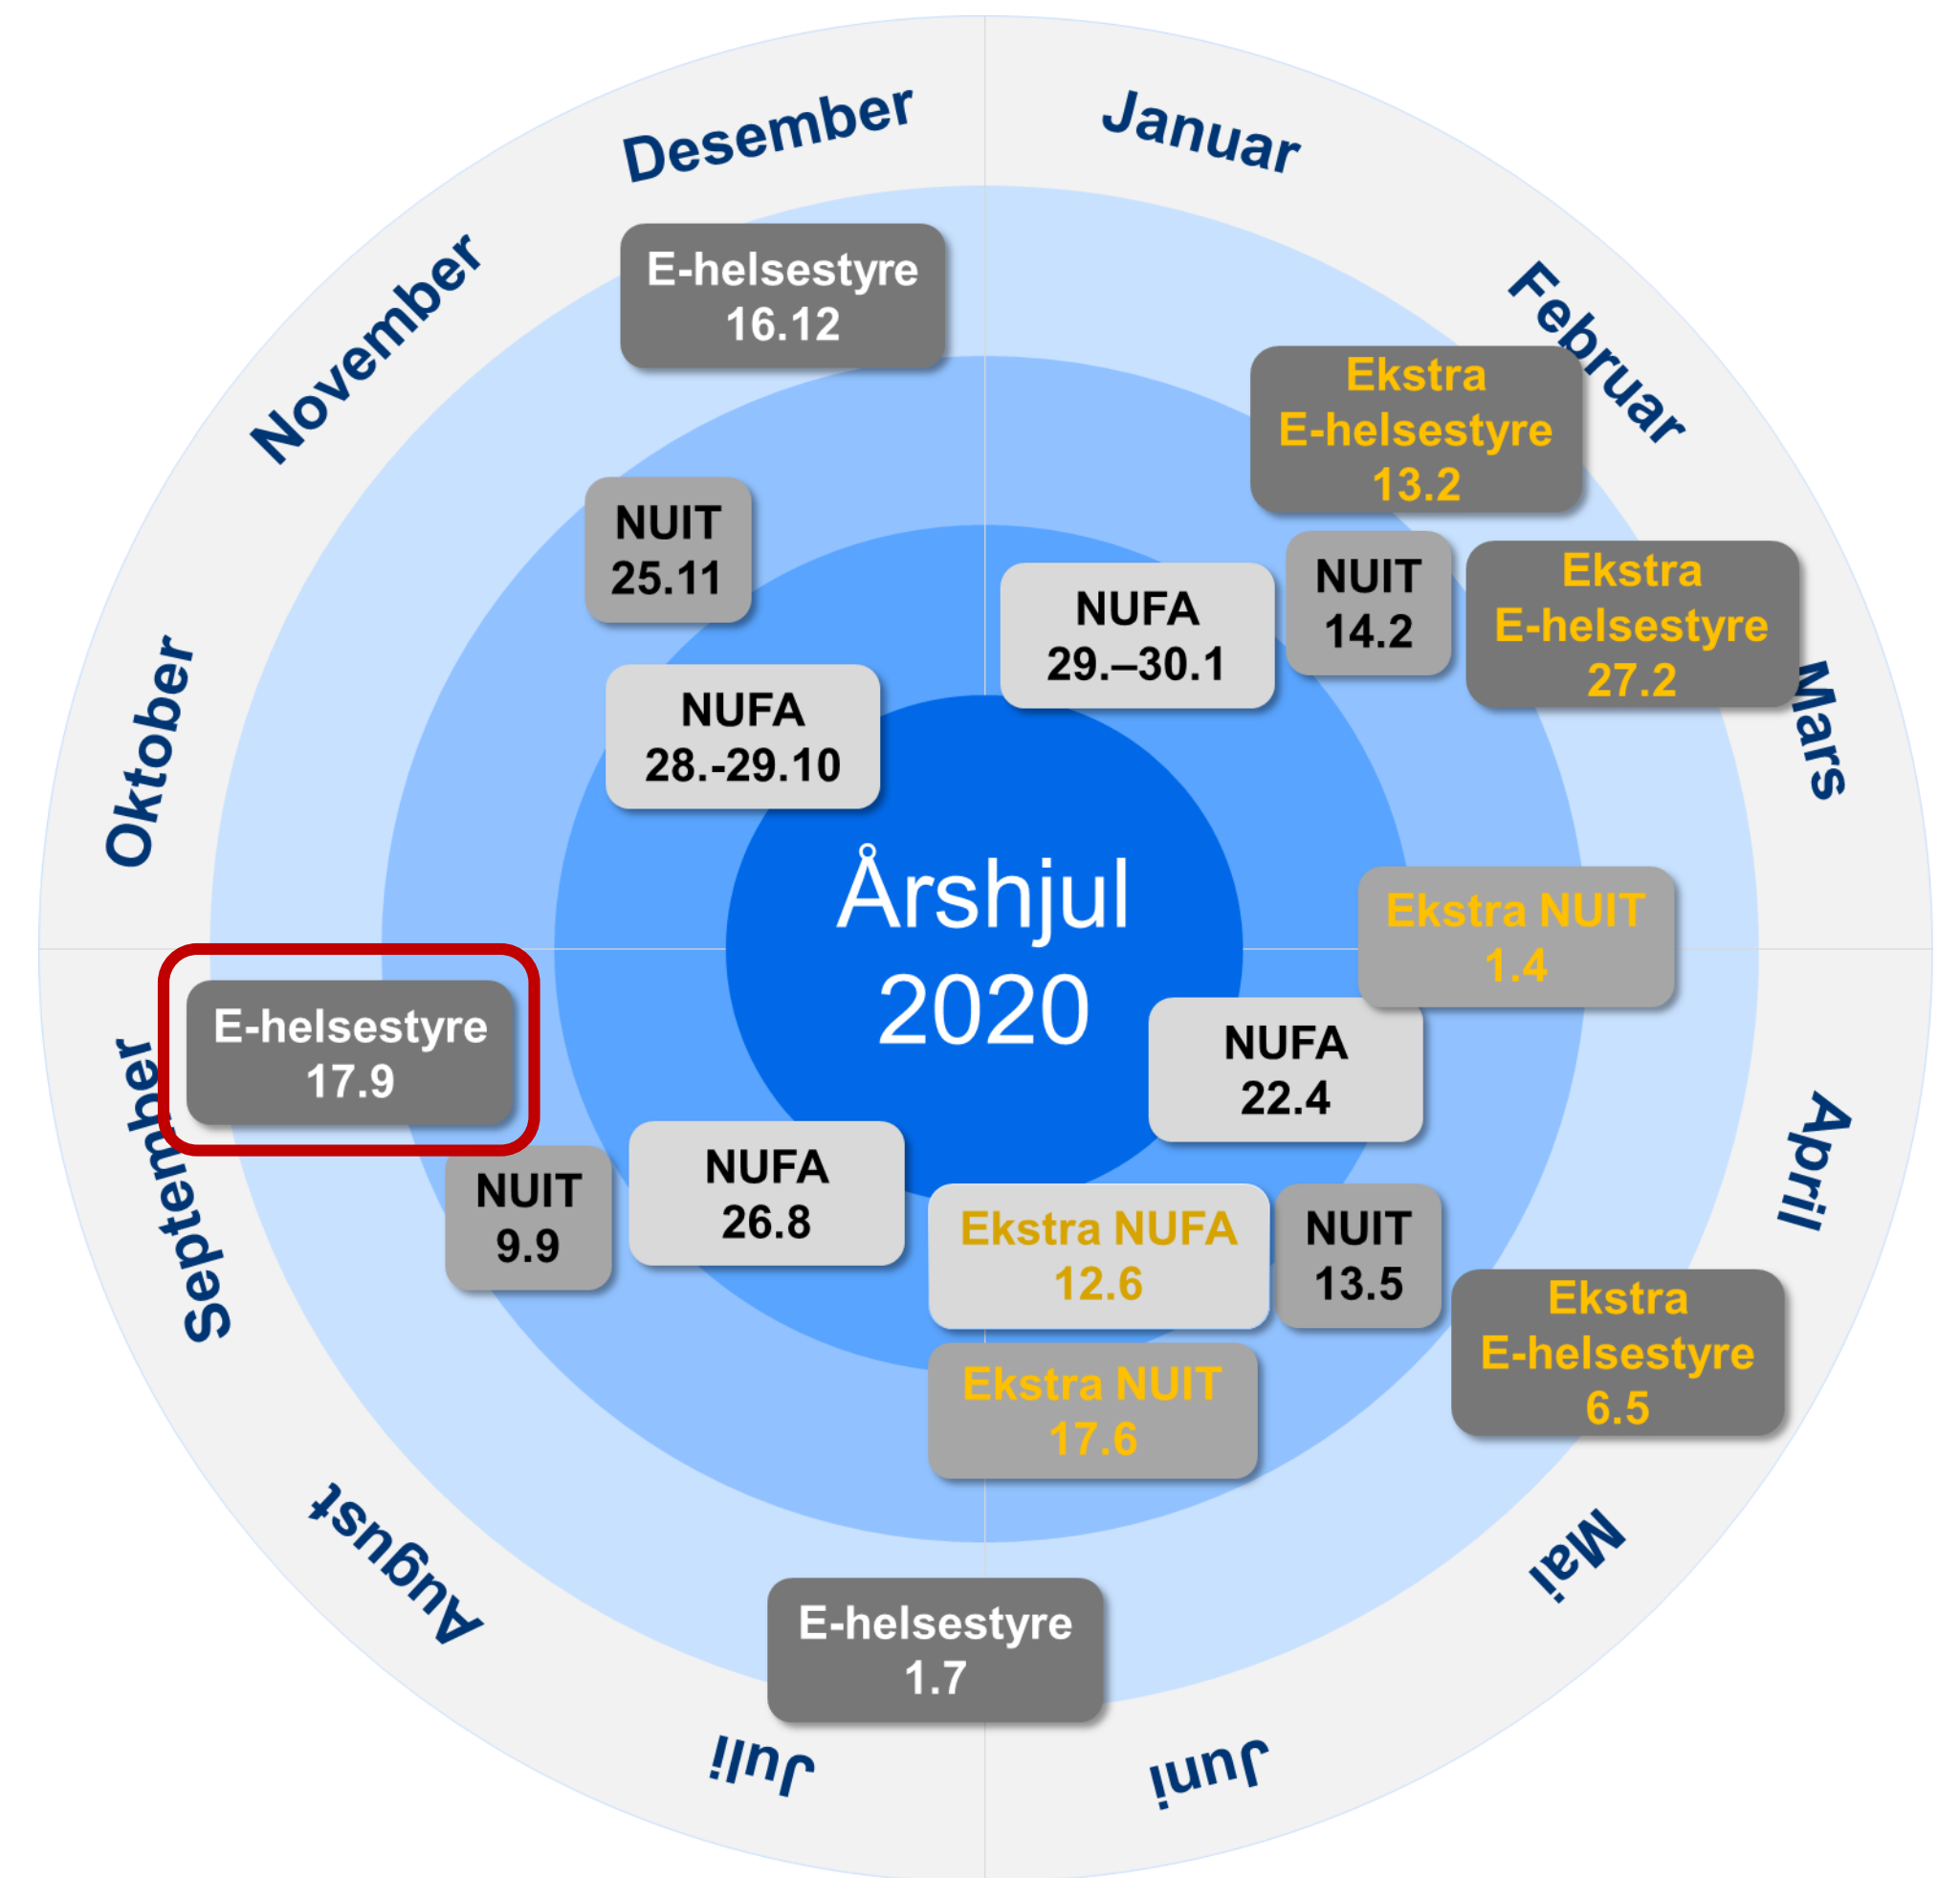

Nasjonalt e-helsestyre tar sakene til orientering.
